



Dashboard EAP MAZ 2026

Guia de Uso — Interface Web & Mobile

-  [Gantt Interativo](#)
-  [Status Report](#)
-  [Requisições](#)
-  [Web & Mobile](#)

Atenção



🔍 DASHBOARD EAP MAZ 2026

Gantt

Status Report

Requisições de Compras

🕒 Atualizado: Mai 2026 🧑 Admin

🔍 Filtros:

Todos os Eixos

Jan - Dez 2026

Todos os Status

🧹 Limpar filtros

42

Total de Ações

18

Concluídas

12

Em Andamento

7

Com Atenção

3

Atrasadas

2

Crítico

67%

% Concluído

RESUMO POR EIXO					
Eixo	Nome	Status	Ações	% Concl.	
Eixo 1	Gestão e Planejamento	Em Dia	5/5	100%	
Eixo 2	Obras e Infraestrutura	Atenção	6/10	60%	
Eixo 3	Educação e Capacitação	Em Dia	4/4	100%	
Eixo 4	Saúde e Saneamento	Atrasado	3/7	43%	
Eixo 5	Meio Ambiente	Em Dia	3/3	100%	
Eixo 6	Geração de Renda	Crítico	1/6	17%	
Eixo 7	Cultura e Esporte	Em Dia	2/2	100%	
Eixo 8	Habitação	Atenção	3/5	60%	
Eixo 9	Segurança Alimentar	Em Dia	4/4	100%	

Aba Status Report — Painel de Controle

🔍 DASHBOARD EAP MAZ 2026

Gantt

Status Report

Requisições de Compras

🕒 Atualizado: Mai 2026

👤 Admin

🔍 Filtros:

Todos os Eixos

Jan - Dez 2026

Todos os Status

🧹 Limpar filtros

38

Total de Requisições

12

Urgente (P1)

9

Alta (P2)

11

Média (P3)

4

Baixa (P4)

2

Sem Prioridade

REQUISIÇÕES POR PRIORIDADE

#	Descrição	Eixo	Valor (R\$)	Responsável	Status	Prioridade
#001	Cimento e areia p/ pavimentação	E2	R\$ 45.000	Dep. Obras	Aprovado	P1
#002	Equipamentos para posto de saúde	E4	R\$ 120.000	Sec. Saúde	Em Análise	P1
#003	Material didático 2026	E3	R\$ 18.500	Sec. Educ.	Aprovado	P2
#004	Tubulação PVC saneamento	E4	R\$ 67.000	SAAE	Pendente	P2
#005	Mudas para reflorestamento	E5	R\$ 8.200	SEMAM	Aprovado	P3
#006	Computadores lab. informática	E3	R\$ 32.000	Sec. Educ.	Recusado	P3
#007	Sementes e insumos agrícolas	E9	R\$ 14.700	Sec. Agric.	Em Análise	P4

Aba Requisições de Compras — Controle de Prioridades

Legenda de Status

Todos os chips de status utilizados no dashboard e seus significados

Em Dia	Ação concluída ou em execução conforme planejado, dentro do prazo.
Em Andamento	Ação iniciada e em execução, com progresso registrado.
Atenção	Ação com risco de atraso; monitoramento intensificado necessário.
Atrasado	Prazo original já ultrapassado; requer plano de recuperação.
Crítico	Situação grave; impacto direto na meta. Intervenção imediata.
Não Iniciado	Ação ainda não começou. Dentro do prazo previsto de início.
Cancelado	Ação cancelada formalmente. Não contabilizada no progresso.

Como usar os Filtros

Filtro de Eixo

Selecione um ou mais eixos temáticos para focar a visualização. "Todos os Eixos" exibe o panorama completo do projeto.

?

Filtro de Data

Define o intervalo de tempo exibido no Gantt e nos relatórios. Use os campos de data inicial e final para recortar o período.

Filtro de Status

Exibe apenas ações com o status selecionado. Útil para focar em pendências críticas ou ações em atraso.

↶

Limpar Filtros

Restaura todos os filtros para o estado padrão (todos os eixos, todo o período, todos os status).

?

Filtros:

Eixo 2 — Obras

Jan - Jun 2026

Atrasado

↑

Resultado: apenas ações atrasadas do Eixo 2 em H1 2026

▼

Eixo 2 — Obras e Infraestrutura

Atrasado

2.3 Ponte sobre o Rio

Atrasado

2.4 Calçamento do Centro

Atrasado

Filtros — Eixo, Data e Status

Filtro de Responsável

?

Desktop

Clique no dropdown "Todos os responsáveis" na barra de filtros superior e marque o(s) nome(s) desejado(s).

?

Mobile

Toque nos chips de nome exibidos entre as abas e o conteúdo, nas abas Gantt e Status Report.

?

O que é filtrado

Mostra apenas eixos, grupos e marcos com tarefas daquele responsável. Linhas sem correspondência somem do Gantt.

⚠

Nenhum marcado

Se nenhum responsável estiver selecionado, o cronograma some e aparece a mensagem verde "SELECIONE AO MENOS UM RESPONSÁVEL". Marque ao menos um nome para reaparecer.

?

Responsável:

Ana

Carlos

Nenhum

↑

Resultado: apenas marcos e tarefas de Ana e Carlos aparecem no cronograma

▼

Eixo 1 — Expografia (responsável: Ana)

Atrasado

2.3 Ponte sobre o Rio


Atrasado

2.4 Calçamento do Centro


Atrasado

Acesso Mobile

O dashboard é 100% responsivo — funciona em smartphone e tablet

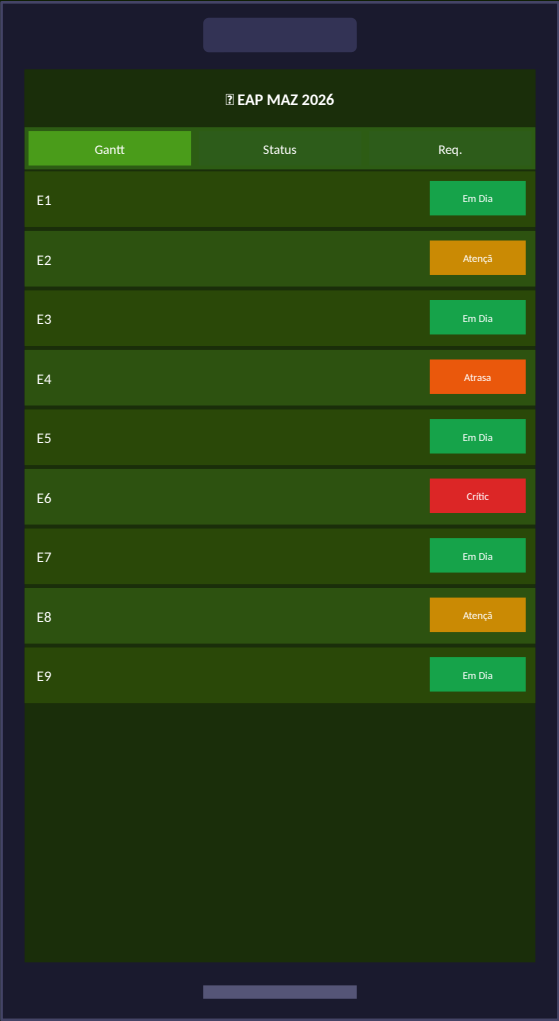

📱 iPhone / Android

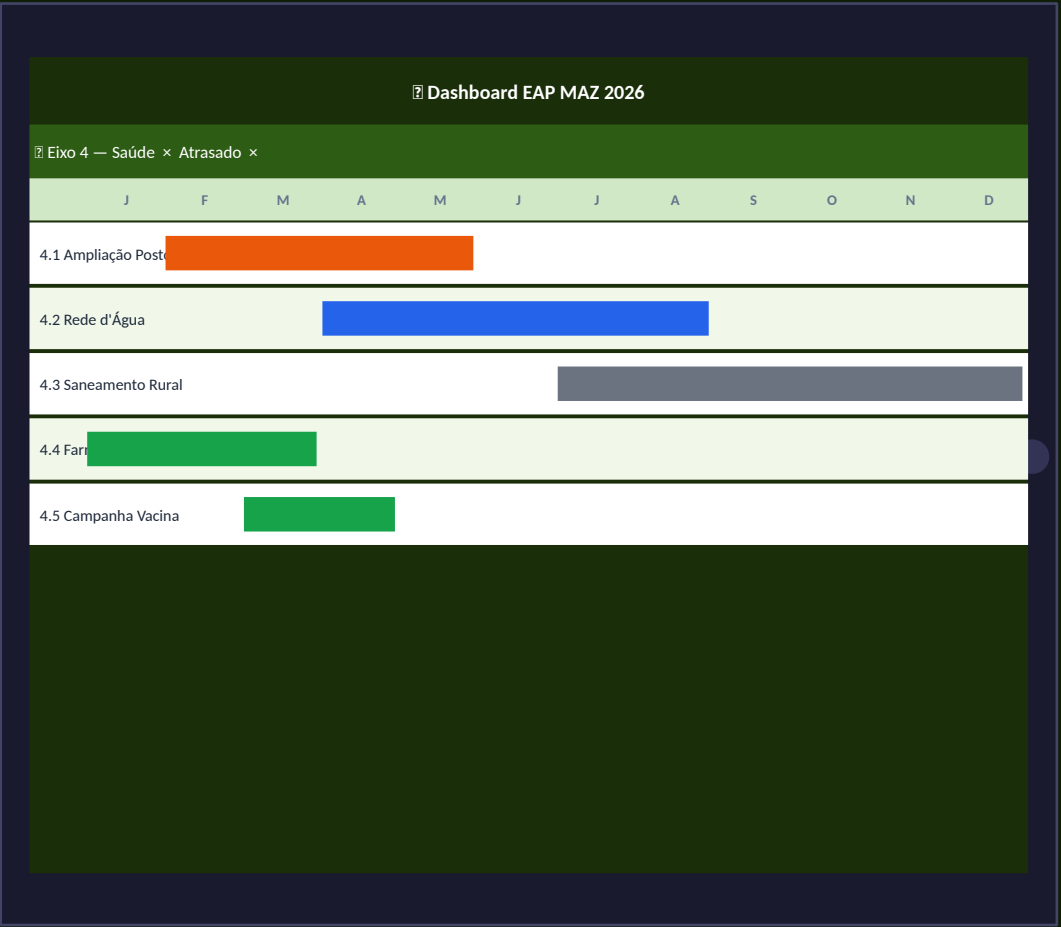

📱 iPad / Tablet

Recursos no Mobile

📱 Layout adaptável — todos os elementos reposicionam automaticamente

📱 Toque nos chips de status para filtrar

📱 Deslize horizontalmente no Gantt para navegar pelo ano

📱 Sem instalação — acesso pelo navegador

📱 Funciona offline após primeiro carregamento

? Como Publicar Atualizações no Dashboard

Fluxo com GitHub Desktop — sem terminal, sem linha de comando

1

? Abra o GitHub Desktop

Após instalação e login com a conta do projeto (exposicoeseprojetos@gmail.com), o app abrirá mostrando o repositório clonado.

2

✎ Edite os arquivos localmente

Faça as alterações nos arquivos do dashboard (ex: gerar_dashboard.py ou dados do Excel) usando qualquer editor de texto.

3

? Revise as mudanças

O GitHub Desktop lista todos os arquivos alterados. Confira cada mudança antes de confirmar.

4


? Escreva um commit

No campo "Summary", descreva a alteração (ex: "Atualiza dados de Junho 2026"). Clique em "Commit to main".

5

? Publique com Push Origin

Clique no botão "Push origin" para enviar as mudanças ao GitHub. Em ~2 minutos o site é atualizado automaticamente.

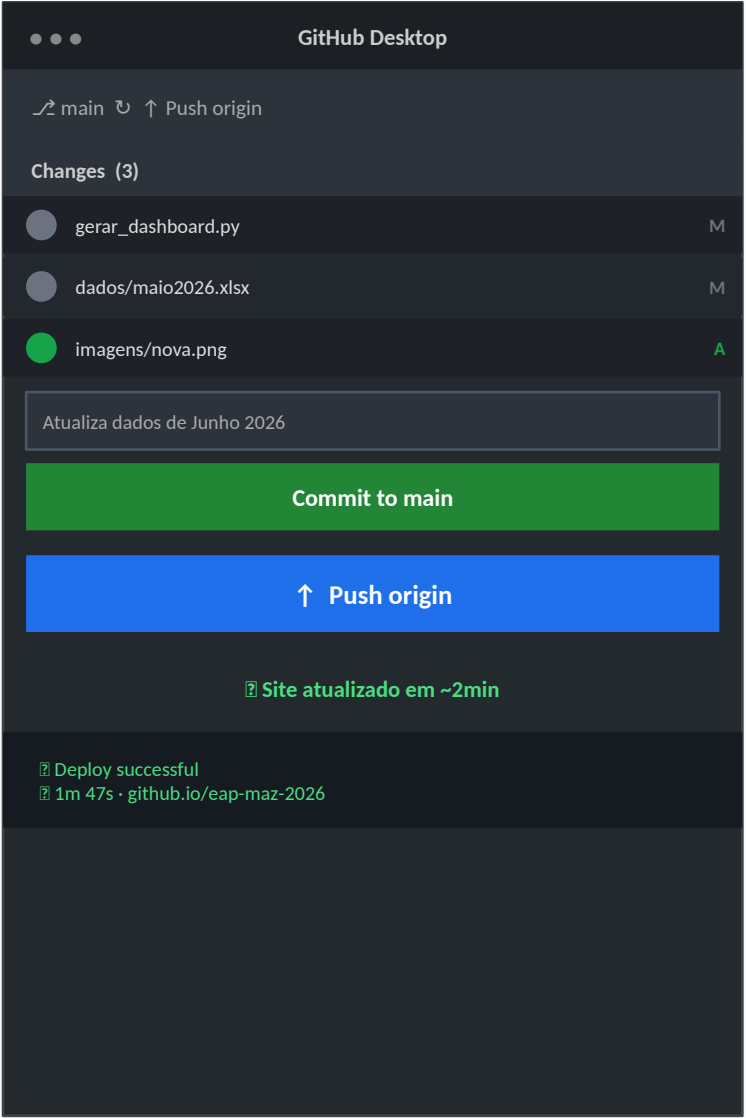



Dashboard EAP MAZ 2026

Transformando dados em decisões para o desenvolvimento de MAZ

 **Acesse o Dashboard**

github.io/eap-maz-2026

 **Suporte Técnico**

exposicoeseprojetos@gmail.com

 **Manual Completo**

[Manual_Dashboard_EAP_MAZ_2026.docx](#)

MAZ — Muquém do São Francisco, Bahia · Maio 2026

Desenvolvido com ♥ para o desenvolvimento sustentável
